JÄTEVEDEN IMEYTYSJÄRJESTELMÄ (5,0 m³)

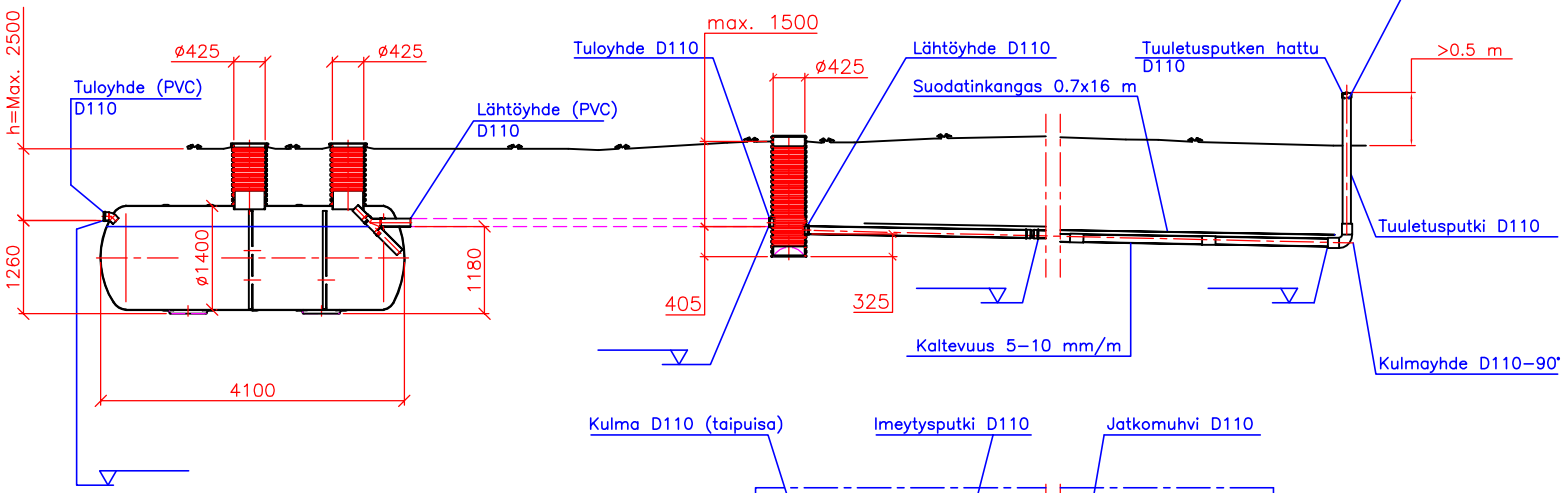

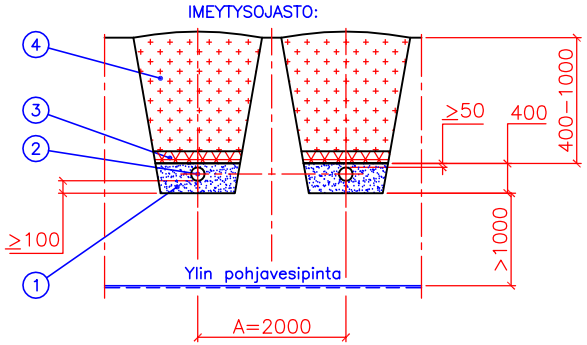

1 Jakokerros (pesty sepeli, raekoko 16–32 mm)
2 Imeytysputkisto
3 Suodatinkangas/lämmöneriste
4 Täytemaa

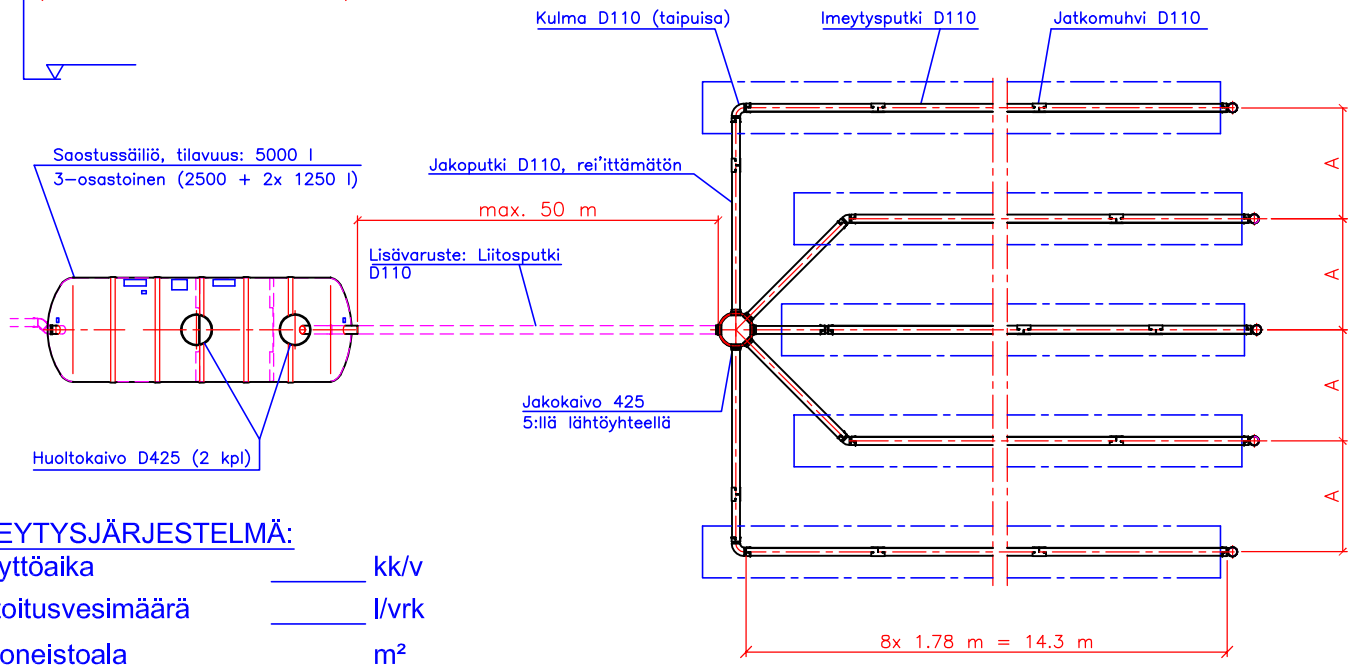

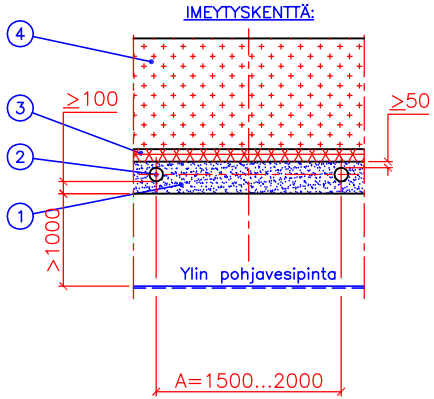

IMEYTYSJÄRJESTELMÄ:

Käyttöaika	_____	kk/v
Mitoitusvesimäärä	_____	l/vrk
Huoneistoala	_____	m²
Henkilömäärä	_____	henkilöä

SAOSTUSSÄILIÖ:

- ☐ harmaat jätevedet
- ☐ kaikki jätevedet
- ☐ ankkurointi
- ☐ lämpöeristys

IMEYTTÄMÖ:

Imeytysputkilinjojen lukumäärä	_____	kpl
Imeytysputkiston kokonaispituus	_____	m
Jätevesimäärä/putkimetri/vrk	_____	l/m/vrk

- ☐ imeytysojasto
- ☐ imeytyskenttä
- ☐ lämpöeristys

wavin Labko

Piir.no: 55EG02as

K.osa/Kylä Kortteli/Tila Tontti/Rn:o	Rakennuslupa N:o
Rakennustoimenpide	Piirustuslaji Juoks.n:o
Rakennuskohteen nimi ja osoite	Piirustuksen sisältö Mittakaavat LABKO SAKO 5000/425L imeytysjärjestelmä
Suunnittelijan nimi, päiväys ja allekirjoitus	Suunnitteluala, työn numero ja piirustus n:o Muutos

16.1.2012 13:37:49
